

Cliente: Prefeitura Municipal de Juiz de Fora
End. Obra:. Rua José Lourenço Kelmer
(Próximo ao Córrego São Pedro)

JUIZ DE FORA- MG
SETEMBRO/2025
721/9925

Cliente: Prefeitura Municipal de Juiz
de Fora

Endereço: Rua José Lourenço Kelmer
(Próximo ao Córrego São Pedro)
Juiz de Fora/MG

Folha: 01/10
Relatório n°: 721/9925

Q. Furos: 8
Total (m): 48,13m

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Juiz de Fora

Rel: 721/9925

END. OBRA: Rua José Lourenço Kelmer (Próximo ao Córrego São Pedro) - Juiz de Fora / MG



Foto 1 - Equipamento de Sondagem em Operação



Foto 2 - Equipamento de Sondagem em Operação

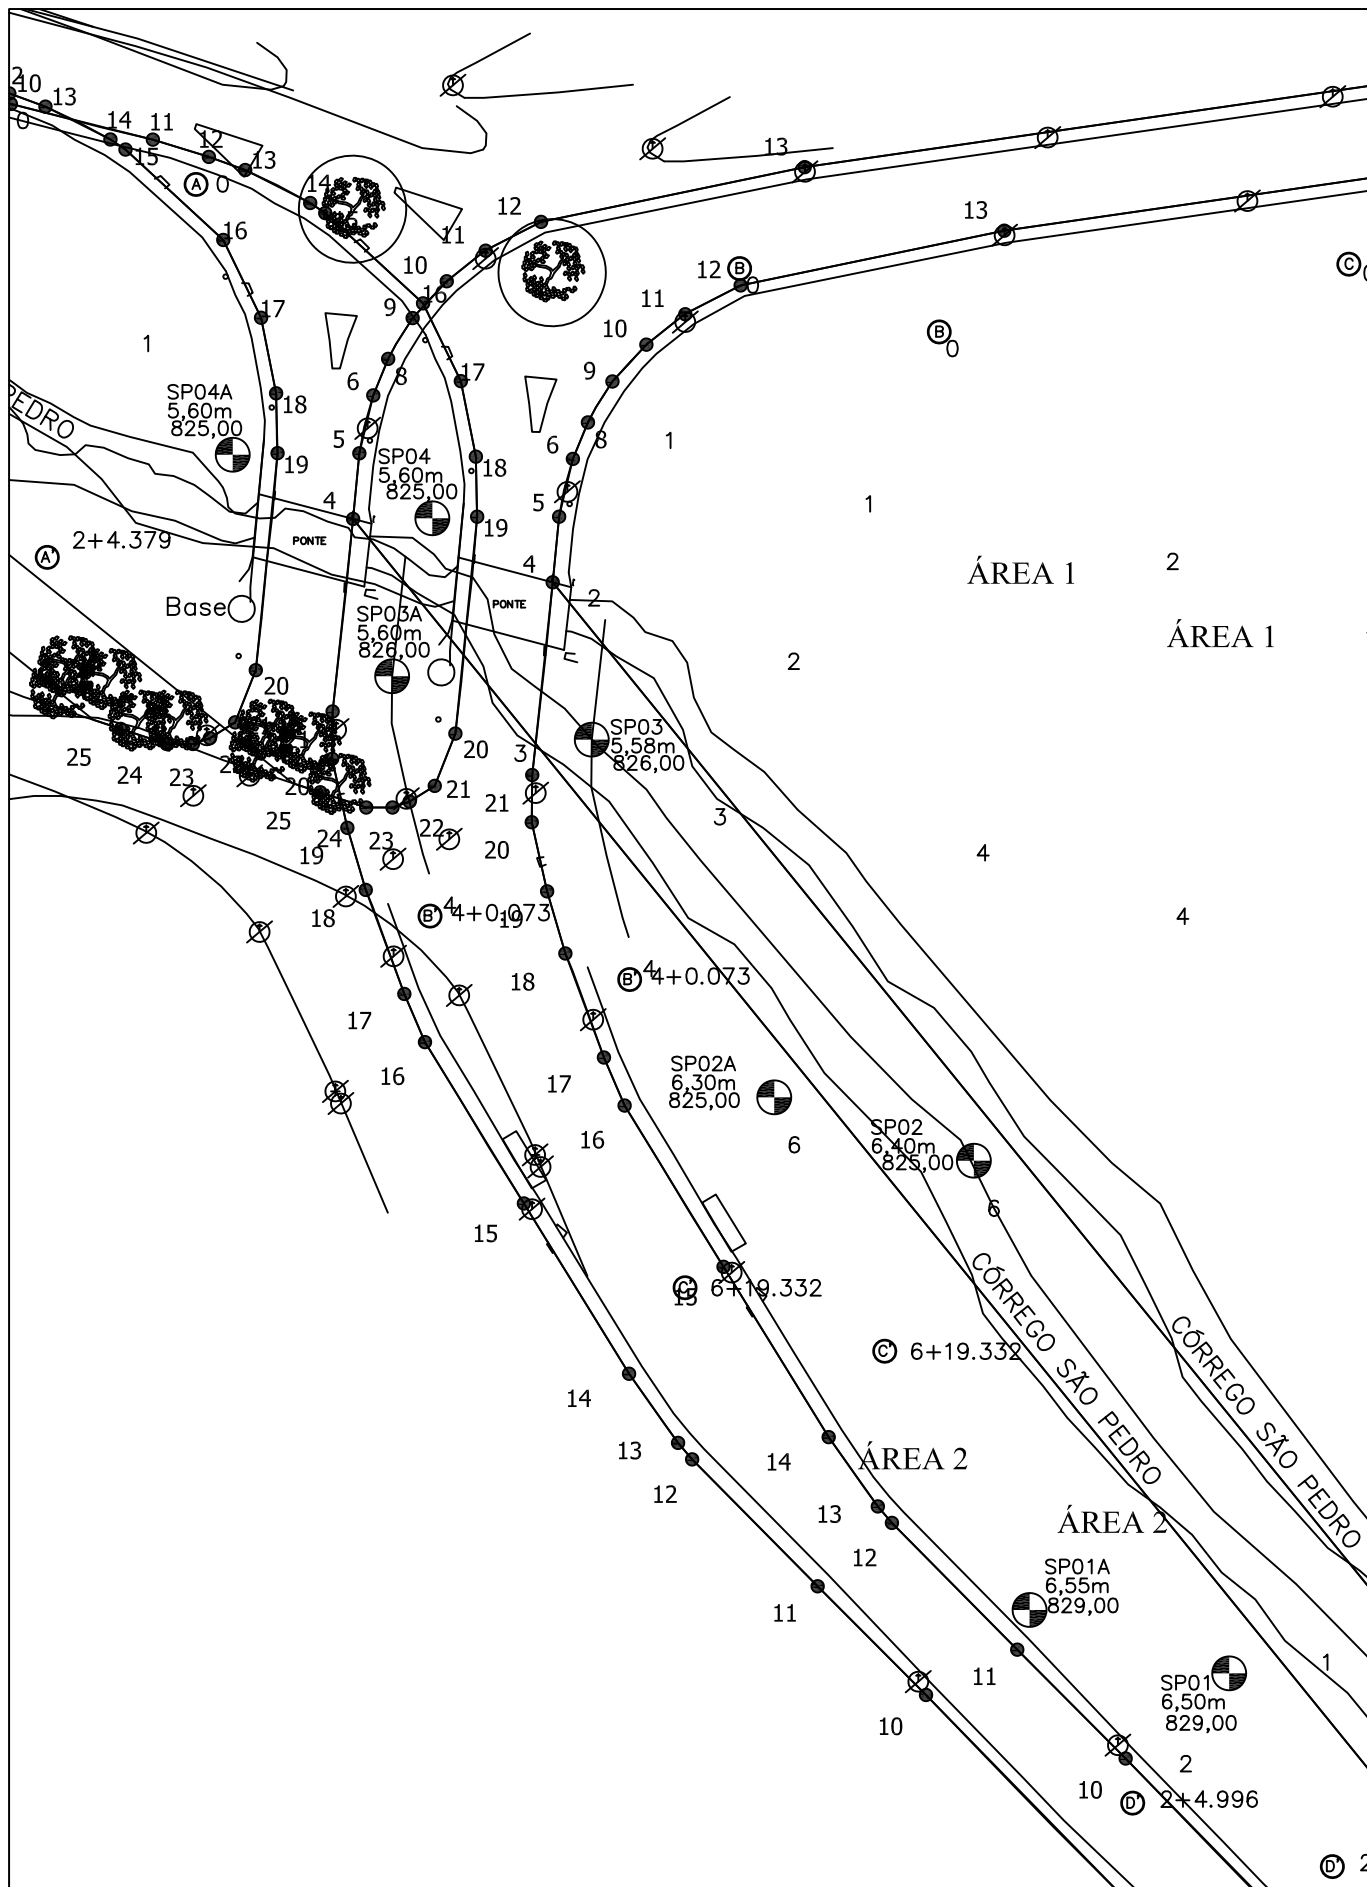


Foto 3 - Equipamento de Sondagem em Operação



Foto 4 - Equipamento de Sondagem em Operação

***NOTA IMPORTANTE :** INSTALAMOS O INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA (INA), CORTESIA E EXCLUSIVIDADE(COBRAMOS APENAS OS TUBOS), DA COTRAL. ESSE DISPOSITIVO PERMITE VERIFICAR A QUALQUER MOMENTO, O NÍVEL DE ÁGUA ESTABILIZADO E A PROFUNDIDADE APROXIMADA DA SONDAGEM EXECUTADA. ESSA É MAIS UMA "GARANTIA" E CERTEZA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS POR NÓS EXECUTADOS. SAIBA MAIS COM NOSSO CONSULTOR TÉCNICO.




CROQUI DE SONDAGEM			Folha 2A/10
Cliente: Prefeitura Municipal de Juiz de Fora			Relatório 721/9925
Endereço: Rua José Lourenço Kelmer - Juiz de Fora / MG			Eng. Lúcio Antônio Triflino Junior - CREA MG 241660/D
Data: 22/09/2025	Desenho Bernardo Serrão	Escala S/Escala	

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP01		
OBRA:	Rua José Lourenço Kelmer (Próximo ao Córrego São Pedro)	INÍCIO: 10/09/2025	TÉRMINO: 11/09/2025	COTA: 829,00
LOCAL:	Juiz de Fora - MG	PROF.: 6,50		




CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP01A		
OBRA:	Rua José Lourenço Kelmer (Próximo ao Córrego São Pedro)	INÍCIO: 10/09/2025	TÉRMINO: 11/09/2025	COTA: 829,00
LOCAL:	Juiz de Fora - MG	PROF.: 6,55		



SONDAGENS - ESTACAS PRÉ - MOLDADAS - TRADO MECÂNICO - ESTACAS RAIZ - HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA - TIRANTES - DRENOS SUBHORIZONTAIS - (32) 3215 - 1279

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP02A		
OBRA:	Rua José Lourenço Kelmer (Próximo ao Córrego São Pedro)	INÍCIO: 10/09/2025	TÉRMINO: 10/09/2025	COTA: 825,00
LOCAL:	Juiz de Fora - MG	PROF.: 6,30		

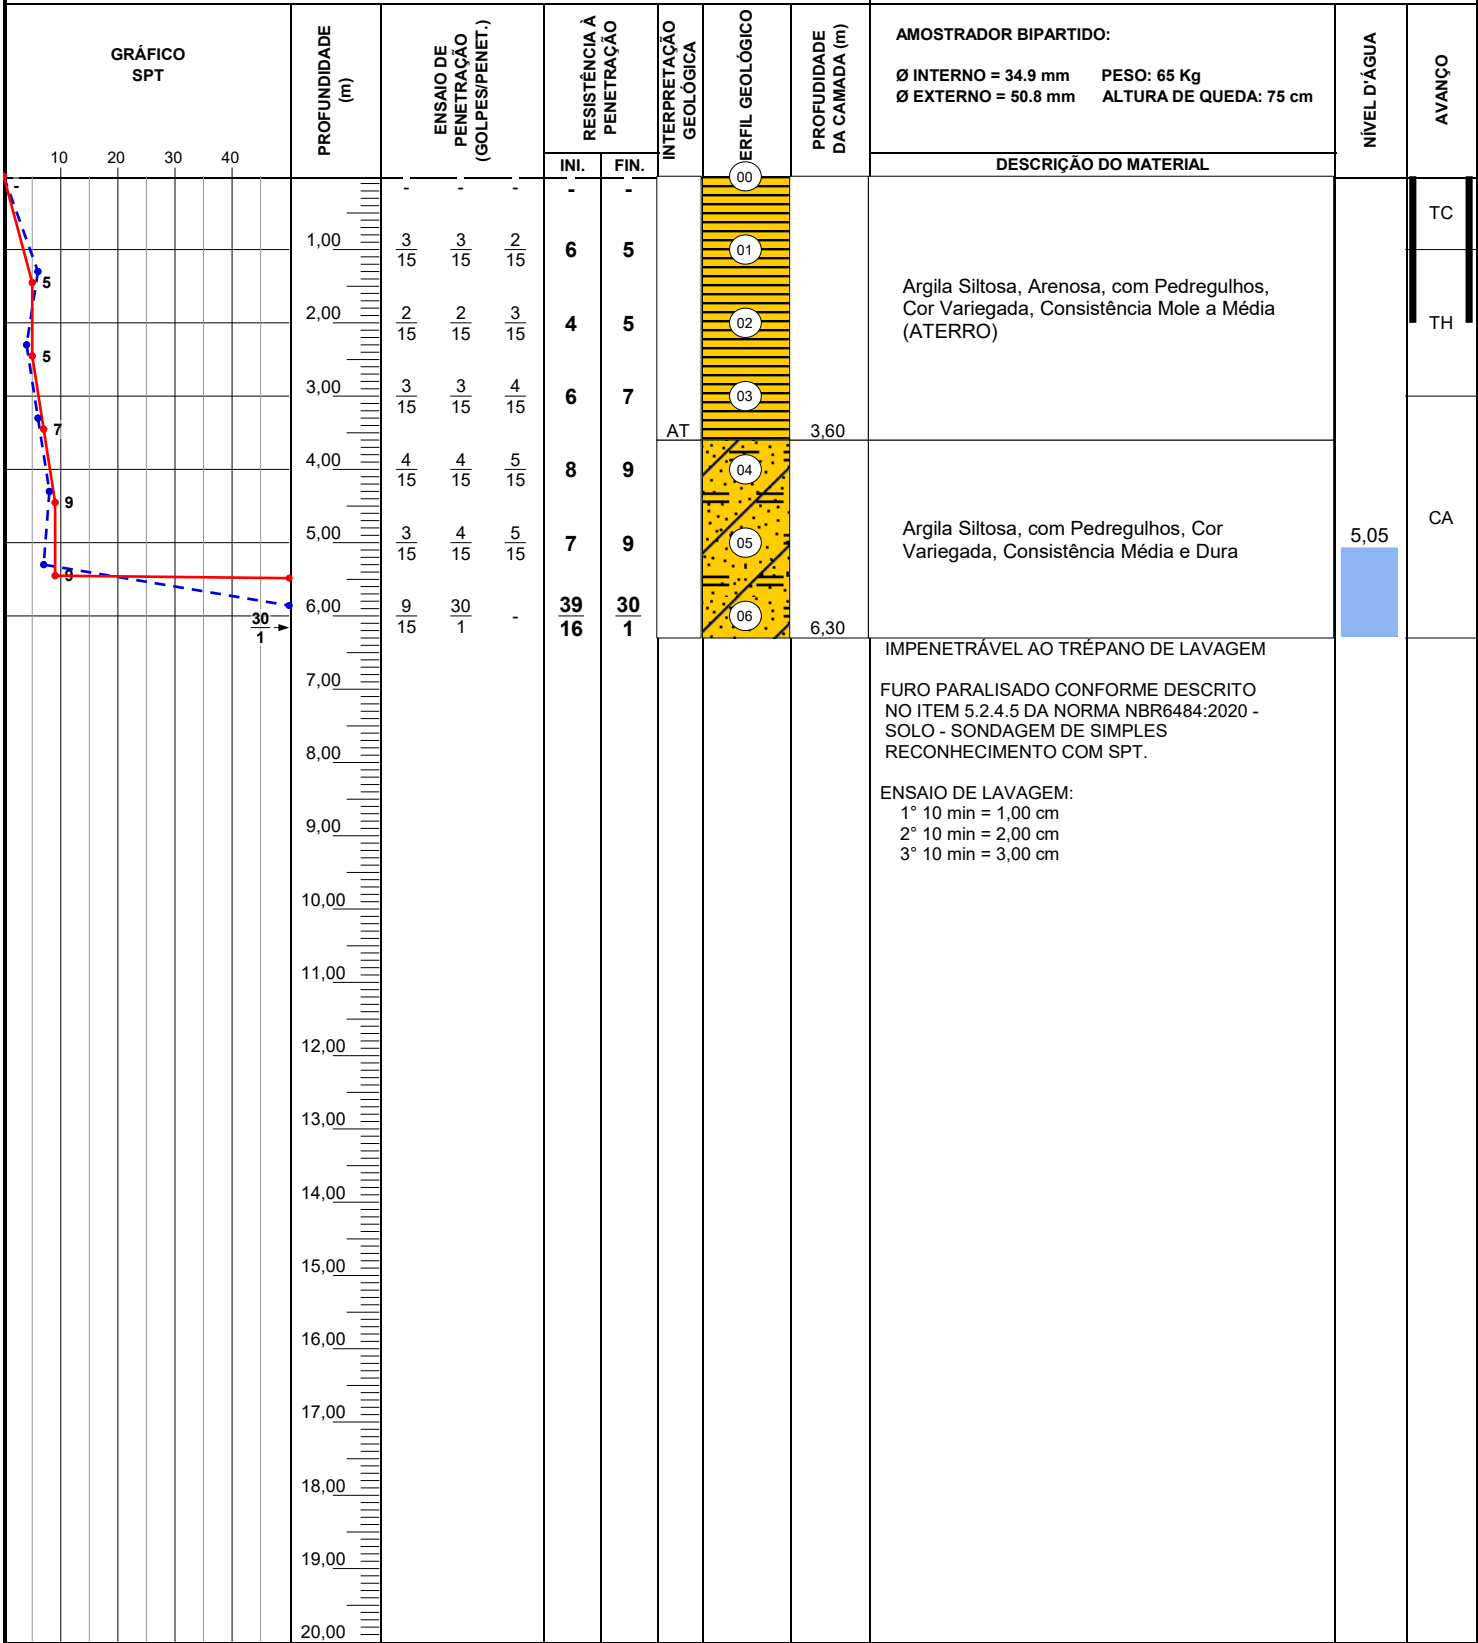

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CADEIRA - TC - TRADO HELICOIDAL - TH - CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA - REVESTIMENTO
ATERRO - AT - SOLO ALUVIONAR - SA - SOLO COLUVIONAR - SC - SOLO FLUVIAL - SF - SOLO MARINHO - SM - SOLO RESIDUAL - SR

N.A. LEITURAS:
1) N.A.: 5,30m em 10/09/2025
2) N.A.: 5,05m em 11/09/2025

OBS.: NA = Ver Esclarecimentos Adicionais Nota 1 ; Imp. ao Trépano (Provável rocha ou matacão) - Ver. Esclarecimentos Adicionais Nota 2;



DATA:	22/09/2025
-------	------------

TRABALHO Nº:	721/9925
--------------	----------

FOLHA:	06
--------	----

RESP.:


ESCALA:
1/10

DESENHISTA:	Bernardo
-------------	----------

SONDADOR:
Carlos Alves


Lúcio Antônio Trifílio Junior
CREA MG 241660/D

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP03		
OBRA:	Rua José Lourenço Kelmer (Próximo ao Córrego São Pedro)	INÍCIO: 09/09/2025	TÉRMINO: 09/09/2025	COTA: 826,00
LOCAL:	Juiz de Fora - MG	PROF.: 5,58		



SONDAGENS - ESTACAS PRÉ - MOLDADAS - TRADO MECÂNICO - ESTACAS RAIZ - HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA - TIRANTES - DRENOS SUBHORIZONTAIS - (32) 3215 - 1279

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP03A		
OBRA:	Rua José Lourenço Kelmer (Próximo ao Córrego São Pedro)	INÍCIO: 09/09/2025	TÉRMINO: 09/09/2025	COTA: 826,00
LOCAL:	Juiz de Fora - MG	PROF.: 5,60		

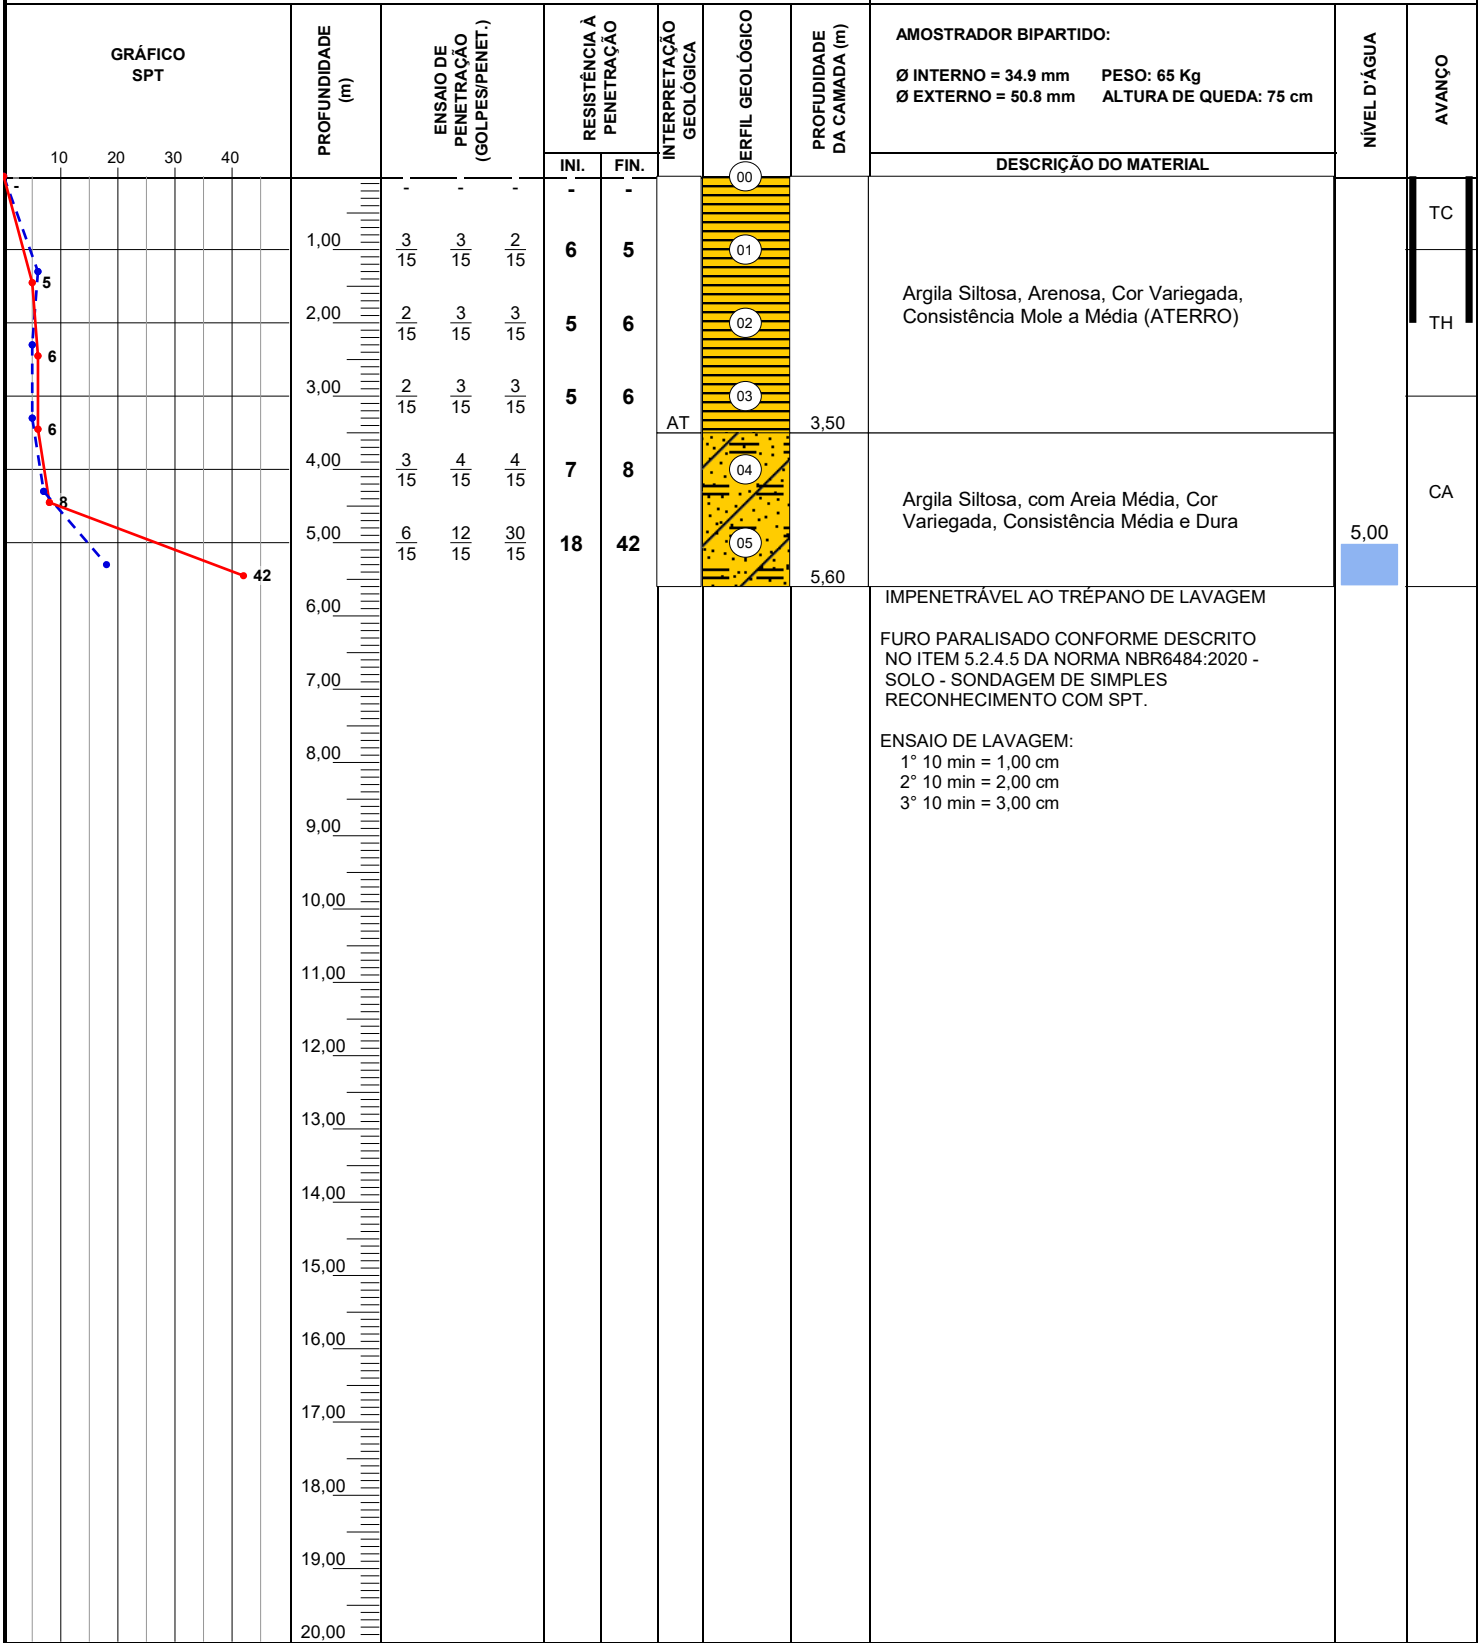


LEGENDA: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - AT • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

	OBS.: NA = Ver Esclarecimentos Adicionais Nota 1 ; Imp. ao Trépino (Provável rocha ou matacão) - Ver. Esclarecimentos Adicionais Nota 2;			
	DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
	22/09/2025	721/9925	08	Lúcio Antônio Trifílio Junior CREA MG 241660/D
ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:		
1/100	Bernardo Serrão	Carlos Alves		

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP04		
OBRA:	Rua José Lourenço Kelmer (Próximo ao Córrego São Pedro)	INÍCIO: 08/09/2025	TÉRMINO: 09/09/2025	COTA: 825,00
LOCAL:	Juiz de Fora - MG	PROF.: 5,60		



CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP04A		
OBRA:	Rua José Lourenço Kelmer (Próximo ao Córrego São Pedro)	INÍCIO: 08/09/2025	TÉRMINO: 09/09/2025	COTA: 825,00
LOCAL:	Juiz de Fora - MG	PROF.: 5,60		



SONDAGENS - ESTACAS PRÉ - MOLDADAS - TRADO MECÂNICO - ESTACAS RAIZ - HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA - TIRANTES - DRENOS SUBHORIZONTAIS - (32) 3215 - 1279
